Platforma Customer 360

Propozycja prac DevOps dla Grupy ORLEN

ORLEN / DLH · wersja 1.6 · 5 października 2026 r.

Czas do środowisk gotowych do integracji	Środowiska
22 tygodnie od startu prac	3: dev, test i prod w osobnych projektach

Czego potrzebuje ORLEN

Ten dokument jest odpowiedzią na spotkanie z zespołem DLH i przekazane materiały: koncepcję backendu, zakres danych i wymagania biznesowe Widoku 360. Widok 360 to wspólne contact center spółek ORLEN, Energa i PGNiG/myORLEN: konsultant po odebraniu połączenia ma widzieć dane klienta ze wszystkich spółek, część z nich na bieżąco, i zlecać zmianę danych. Backend ma powstać na Google Cloud według koncepcji DLH: serwisy na GKE, Cloud SQL PostgreSQL jako indeks klienta i zapasowe źródło D-1, zdarzenia przez Pub/Sub, ładowanie D-1 z warstwy gold. Brakuje platformy: klastra GKE, wejścia ruchu z mTLS i pipeline'ów wdrożeniowych. FOTC dostarcza tę platformę: projekty, GKE, Cloud SQL, Pub/Sub, Cloud Tasks, Gate, pipeline'y, bezpieczeństwo infrastruktury i wdrożenie produkcyjne ze wsparciem po starcie. Kod serwisów (część Development) i modele dbt (część Data) są wyceniane osobno.

Założenia

- Poziom projektu i sieć prowadzi ORLEN (projekty, IAM projektowe, polityki, budżety, podsieci, PSC, Cloud DNS, firewall, logowanie centralne, SIEM); FOTC podaje zapotrzebowanie, wpina zasoby i zarządza uprawnieniami na zasobach.
- Korzystamy z modułów Terraform i pipeline'ów Azure DevOps z DLH i CSZZ (LB z mTLS, Cloud SQL, Pub/Sub, Cloud Tasks, Cloud Run job), z obecnym modelem kont serwisowych. Nowy element to GKE Standard i jego ekspozycja.
- Trzy środowiska w osobnych projektach: nowe `prj-{d,t,p}-dlh-gateway-*` i `prj-{d,t,p}-dlh-c360-bff-*`, ETL w istniejących `prj-{d,t,p}-dlh-share-*`. Region `europe-central2`, Shared VPC ORLEN.
- Harmonogram zakłada 5 dni roboczych ORLEN na wniosek.
- Gate to wewnętrzny Application LB w sieci ORLEN; frontend Widok 360 powstaje u innego dostawcy na podstawie specyfikacji API i nie jest częścią tej wyceny.
- API spółek działają on-prem po HTTPS z mTLS, certyfikaty wydaje PKI ORLEN. Kontener deserializatora zdarzeń dostarcza ORLEN, FOTC go wdraża. Kolektor zdarzeń jest wyceniony w osobnym dokumencie.
- Monitoring, logowanie centralne, SIEM, dashboardy i alerty pozostają po stronie ORLEN. Observability platformy (łącznie z telemetrią na poziomie service mesh) FOTC może wycenić osobno po ustaleniu wymagań; ta wycena jej nie obejmuje.

Rozwiązanie: platforma na Google Cloud

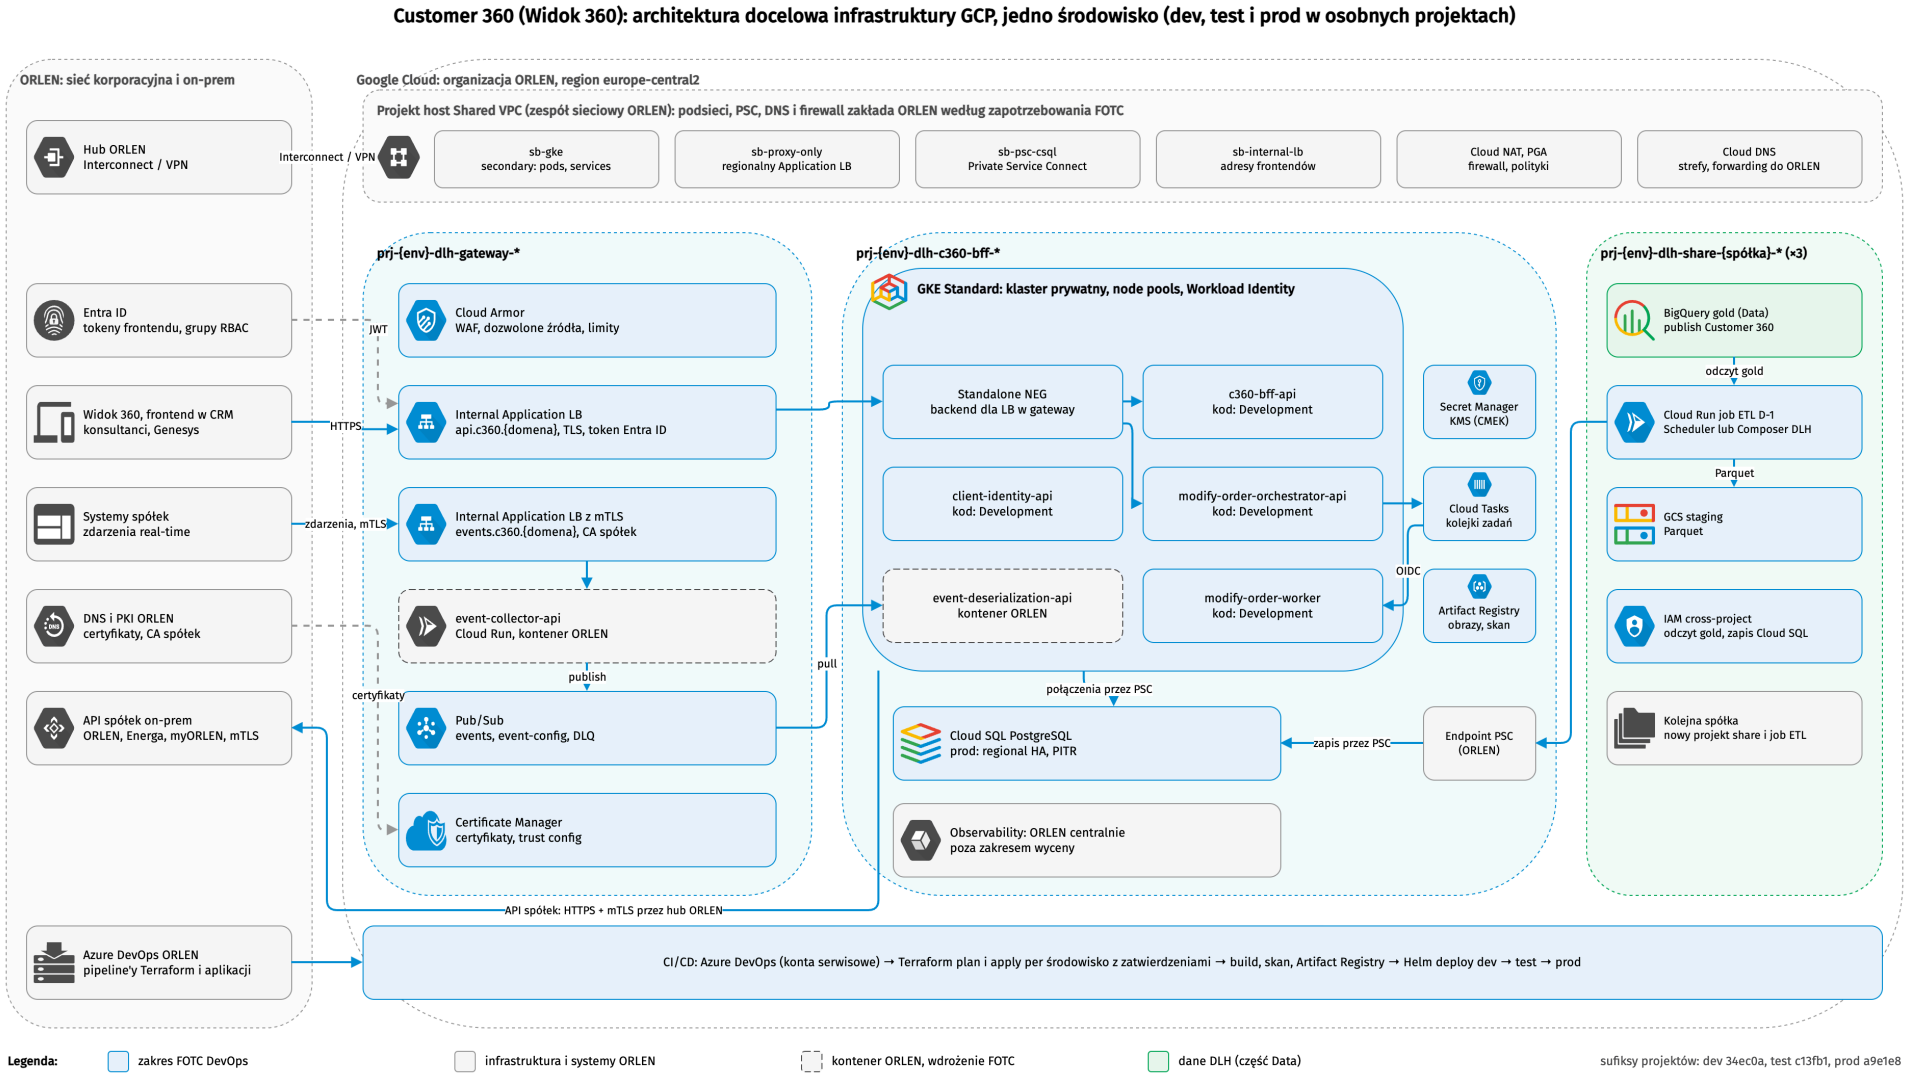


Diagram pokazuje jedno środowisko; dev, test i prod mają ten sam układ w osobnych projektach. Wersja w pełnej rozdzielczości jest w osobnym pliku.

Podział odpowiedzialności

Warstwa	FOTC buduje	ORLEN zapewnia
Projekty	Moduł bazowy: API, konta serwisowe aplikacji, Artifact Registry, Secret Manager, uprawnienia na zasobach	Projekty, IAM projektowe, polityki organizacyjne, budżety
Sieć	Zapotrzebowanie na zakresy, porty i rekordy; wpięcie zasobów w podsieci i endpoint PSC; testy łączności	Podsieci z zakresami secondary i proxy-only, PSC, Cloud DNS, firewall, NAT, hub do on-prem
Gate	Wewnętrzny Application LB, Cloud Armor, Certificate Manager, osobny frontend mTLS dla zdarzeń	Certyfikaty z PKI, CA spółek, rejestracja aplikacji w Entra ID
Platforma	GKE Standard (klaster prywatny, node pools, Workload Identity), ekspozycja przez NEG, Helm, sekrety	Grupy do RBAC, wyjątki polityk pod GKE
Usługi zarządzane	Cloud SQL PostgreSQL (prod HA, PITR), Pub/Sub, Cloud Tasks	Endpoint PSC, decyzja o CMEK, okna serwisowe
ETL D-1	Runtime Cloud Run job w projektach share, IAM cross-project	Datasety gold (część Data), role w projektach share
CI/CD	Pipeline'y Azure DevOps w obecnym modelu kont serwisowych, charty Helm, promocja dev → test → prod	Projekt Azure DevOps, agenci, konta serwisowe, zatwierdzenia
Observability	Eksport metryk i logów z zasobów w ramach modułów	Monitoring, dashboardy, alerty, centralne logowanie, SIEM, dyżury; observability platformy do osobnej wyceny

Rezultat dla ORLEN

- Jedna platforma dla trzech środowisk w konwencji istniejącego kodu DLH, utrzymywana tymi samymi narzędziami co dziś.
- Serwisy Development wdrażane z pipeline'u bez ręcznych kroków, z promocją dev, test, prod i zatwierdzeniami.
- Dane spółek wchodzą tylko przez mTLS i wewnętrzny LB, bez ekspozycji w internecie; uprawnienia na zasobach zgodne z polityką ORLEN.
- Środowiska gotowe do integracji z frontendem i API spółek w fazie C, z planem DR i wsparciem po uruchomieniu.

Zakres prac i harmonogram

Epik	Nazwa
D1	Projekt techniczny
D2	Dostępy i wnioski
D3	Fundament IaC i wpięcie w sieć
D4	Platforma GKE
D5	Gate
D6	Usługi zarządzane: Cloud SQL, Pub/Sub, Cloud Tasks
D7	Runtime ETL D-1
D8	CI/CD aplikacyjne
D9	Bezpieczeństwo
D10	Wydania, DR, uruchomienie i przekazanie

W ramach tego zakresu FOTC odpowiada za moduły Terraform i ich wdrożenie na trzech środowiskach, klaster GKE z ekspozycją, bazę i kolejki, pipeline'y oraz wdrożenie produkcyjne ze wsparciem. Rezerwa na nieznane jest tylko w GKE (pierwszy klaster w tej organizacji) i w dostępach. Jeżeli zakres API spółek zmieni się po akceptacji, wycenę aktualizujemy przed startem fazy B.

Poza zakresem bazowym

- **Binary Authorization dla obrazów kontenerów, do decyzji ORLEN.** Atestor i klucz KMS, podpisywanie obrazów w pipeline, polityka per klaster od dry-run do egzekwowania, wyjątki dla obrazów systemowych, procedura awaryjna, testy na trzech środowiskach. Po wdrożeniu na prod uruchamiają się tylko obrazy podpisane w pipeline.
- **Observability platformy.** Dashboardy, alerty, SLO i telemetria na poziomie service mesh pozostają po stronie ORLEN; na życzenie FOTC wyceni je osobno po ustaleniu wymagań.
- **Kolektor zdarzeń (event-collector-api), niezależny projekt.** Na prośbę DLH wyceniony w osobnym dokumencie razem z koordynacją ze spółkami: siecią, certyfikatami, uprawnieniami i uzgodnieniami. Przy wspólnym zamówieniu elementy wspólne (frontend mTLS dla zdarzeń, tematy Pub/Sub, szablon pipeline'u) liczymy raz.

Harmonogram, ryzyka i kolejny krok

Harmonogram

Harmonogram liczymy od startu prac; terminy docelowe wyznacza DLH.

Faza	Czas od startu	Zakres
A. Projekt i wnioski	tygodnie 1–6	D1, D2, D3 na dev
B. Platforma dev i test	tygodnie 7–14	D4, D5, D6 na dev i test, D8 na dev
C. Prod i integracje	tygodnie 15–22	D7, D4 do D6 na prod, D9; środowiska gotowe do integracji
D. Testy i uruchomienie	od tygodnia 23 do uruchomienia plus 2 tygodnie wsparcia	D10: DR, testy integracyjne, produkcja, wsparcie po uruchomieniu, przekazanie

Ryzyka

Ryzyko	Postępowanie
Czas realizacji wniosków o projekty, podsieci, role, firewall i certyfikaty	Komplet wniosków w pierwszym tygodniu (D2), cotygodniowy przegląd z DLH, eskalacja po 5 dniach roboczych
Pierwsze GKE w ORLEN: polityki organizacyjne, zakresy adresowe, role w projekcie host	Analiza polityk przed fazą B, klaster Standard prywatny z jednym node poolem na start, wczesny test na dev
API spółek nieustalone, planowana zmiana źródła danych Energa	Testy łączności na poziomie sieci niezależnie od gotowości API

Pytania do rozstrzygnięcia

1. Gdzie działają API spółek i kto wydaje certyfikaty mTLS po ich stronie?
2. Czy projekty DLH są objęte perymetrem VPC Service Controls?
3. Jakie są wymagania CMEK, SIEM i retencji logów?
4. Jakie sufiksy dostaną nowe projekty gateway i c360-bff?
5. Który tenant Entra ID wystawia tokeny dla wywołań Gate?

Kolejny krok

1. Uzgodnienie zakresu i harmonogramu z DLH oraz odpowiedzi na pytania powyżej.
2. Wskazanie osób po stronie ORLEN odpowiedzialnych za projekty, sieć i Azure DevOps.
3. Start fazy A: komplet wniosków w pierwszym tygodniu, warsztaty i HLD w pierwszych dwóch tygodniach.

Dziękujemy za możliwość przedstawienia tej propozycji.
